




Activitat mensual

Infraestructures
Ferroviàries
de Catalunya

Abril 2022

Estat de les obres de la Línia 9

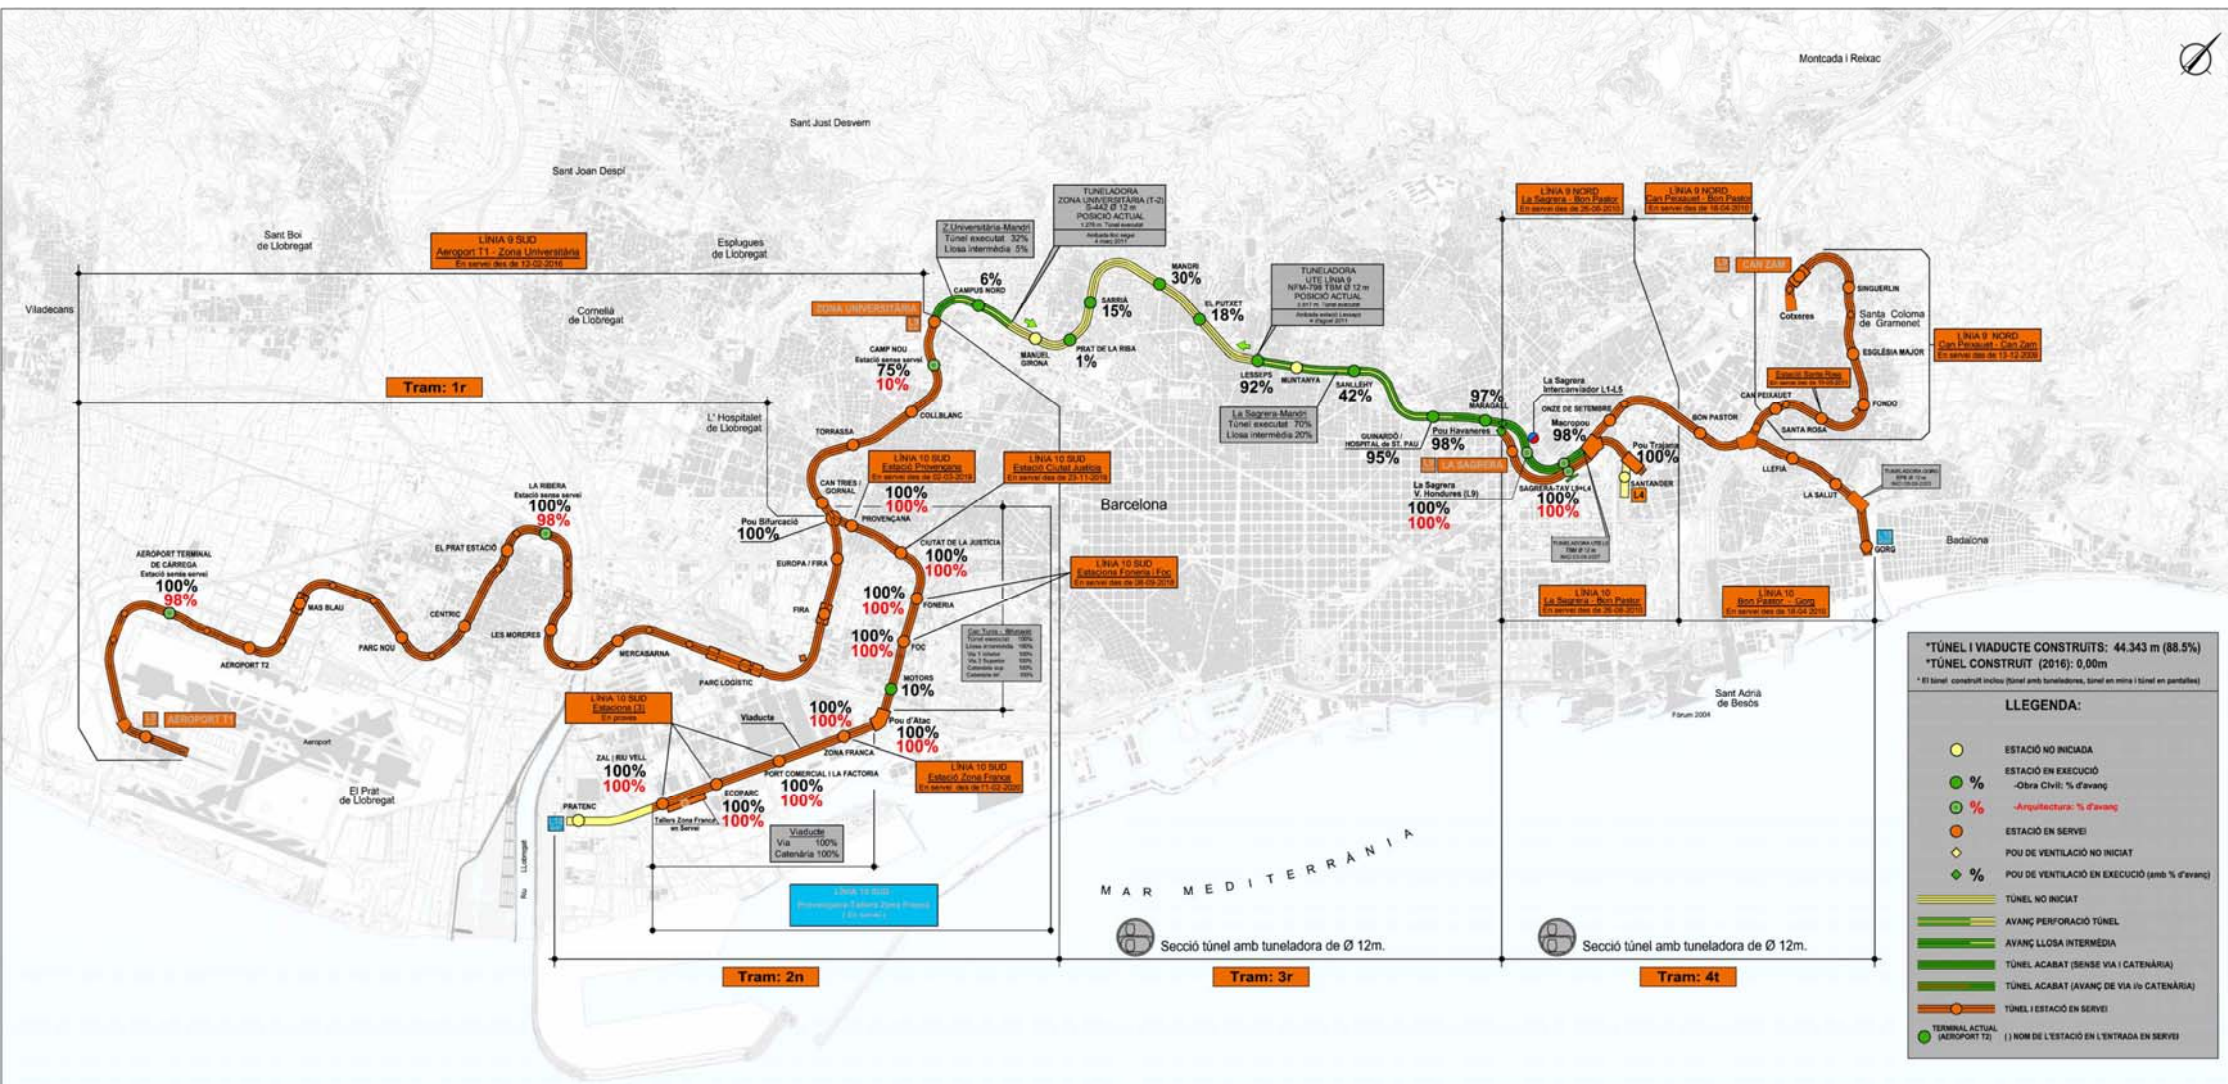

Actuacions en execució abril 2022

Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Zona Universitària – Mandri.
Clau: TM-00509.4F2-M1

- Treballs principals període
 - Es segueix treballant en la posada a punt de la tuneladora S442 i instal·lacions auxiliars associades.
 - Tancament de l'estructura del forjat provisional i instal·lacions auxiliars al pou estació Camp Nou.
- Planificació
 - Des del juliol'21 al març'22 treballs de la posada a punt de la tuneladora S442.
 - A l'abril'22 inici de les proves per a l'excavació del túnel pendent del Tram 3.



Demolició de la llosa del fossat de terres



Instal·lació de la cinta a la galeria



Substitució dels raspalls a la cua de l'escut

Actuacions en execució abril 2022

Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram 3r. Mandri – Sagrera Meridiana.
Clau: TM-00509.4F1-M1

- Treballs principals període: reinici l'1 de febrer de 2022
 - Treballs previs al desmuntatge de la tuneladora a l'interior del túnel, retirada de via i altres instal·lacions existents.
 - Condicionament del pou de Guinardó i treballs de demolició del dau de formigó a la galeria d'accés.
 - Retirada de dovelles i altres instal·lacions al pou Sant Andreu-Bifurcació (Macropou).
- Planificació
 - Des del febrer'22 a l'abril'23 treballs de desmuntatge de la tuneladora NFM.



Retirada de dovelles emmagatzemades a Macropou



Retirada de la depuradora al Macropou



Demolició del dau de formigó d'accés al túnel des del pou de Guinardó

Actuacions en execució abril 2022

Estació L9 Mandri (TM-00509.4B-M5). Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

- Treballs principals període
 - Continuació jardí Germanes Missioneres: previsió finalització abril 2022.
 - S'està treballant en les bigues de lligat de les pantalles del vestíbul.
 - Inspeccions tècniques d'edificis concloses.
 - Muntatge del pòrtic grua.
- Previsió planificació any 2022.
 - Previsió de la 1a voladura de la 2a fase per la setmana 28 març-01 abril
 - Continuació amb l'excavació del pou.



Muntatge del pòrtic grua



Treballs d'urbanització de les Germanes Missioneres

Actuacions en execució abril 2022

Estació L9 Sarrià (TM-00509.4B-M5). Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

Treballs principals període:

- Finalització del muntatge pòrtic grua.
- Inspecció tècnica d'edificis entorn estació en execució.
- Gestió i projecte de desviament SSAA.
- Execució de la sortida d'emergència i ventilació.
- Tall amb fil de les pantalles del pou i inici de l'excavació del pou.

Previsió planificació (any 2022):

- Inici microvoladures: estiu 2022.
- Desviament SSAA.
- Inici 1a fase pantalles vestíbul: primer semestre 2022.



Obertura de la connexió entre el pou i la sortida d'emergència i ventilació



Treballs preparatoris a l'excavació del pou

