

Activitat mensual


Infraestructures
Ferroviàries
de Catalunya

Desembre 2021

 Generalitat
de Catalunya

 Ifercat

Estat de les obres de la Línia 9

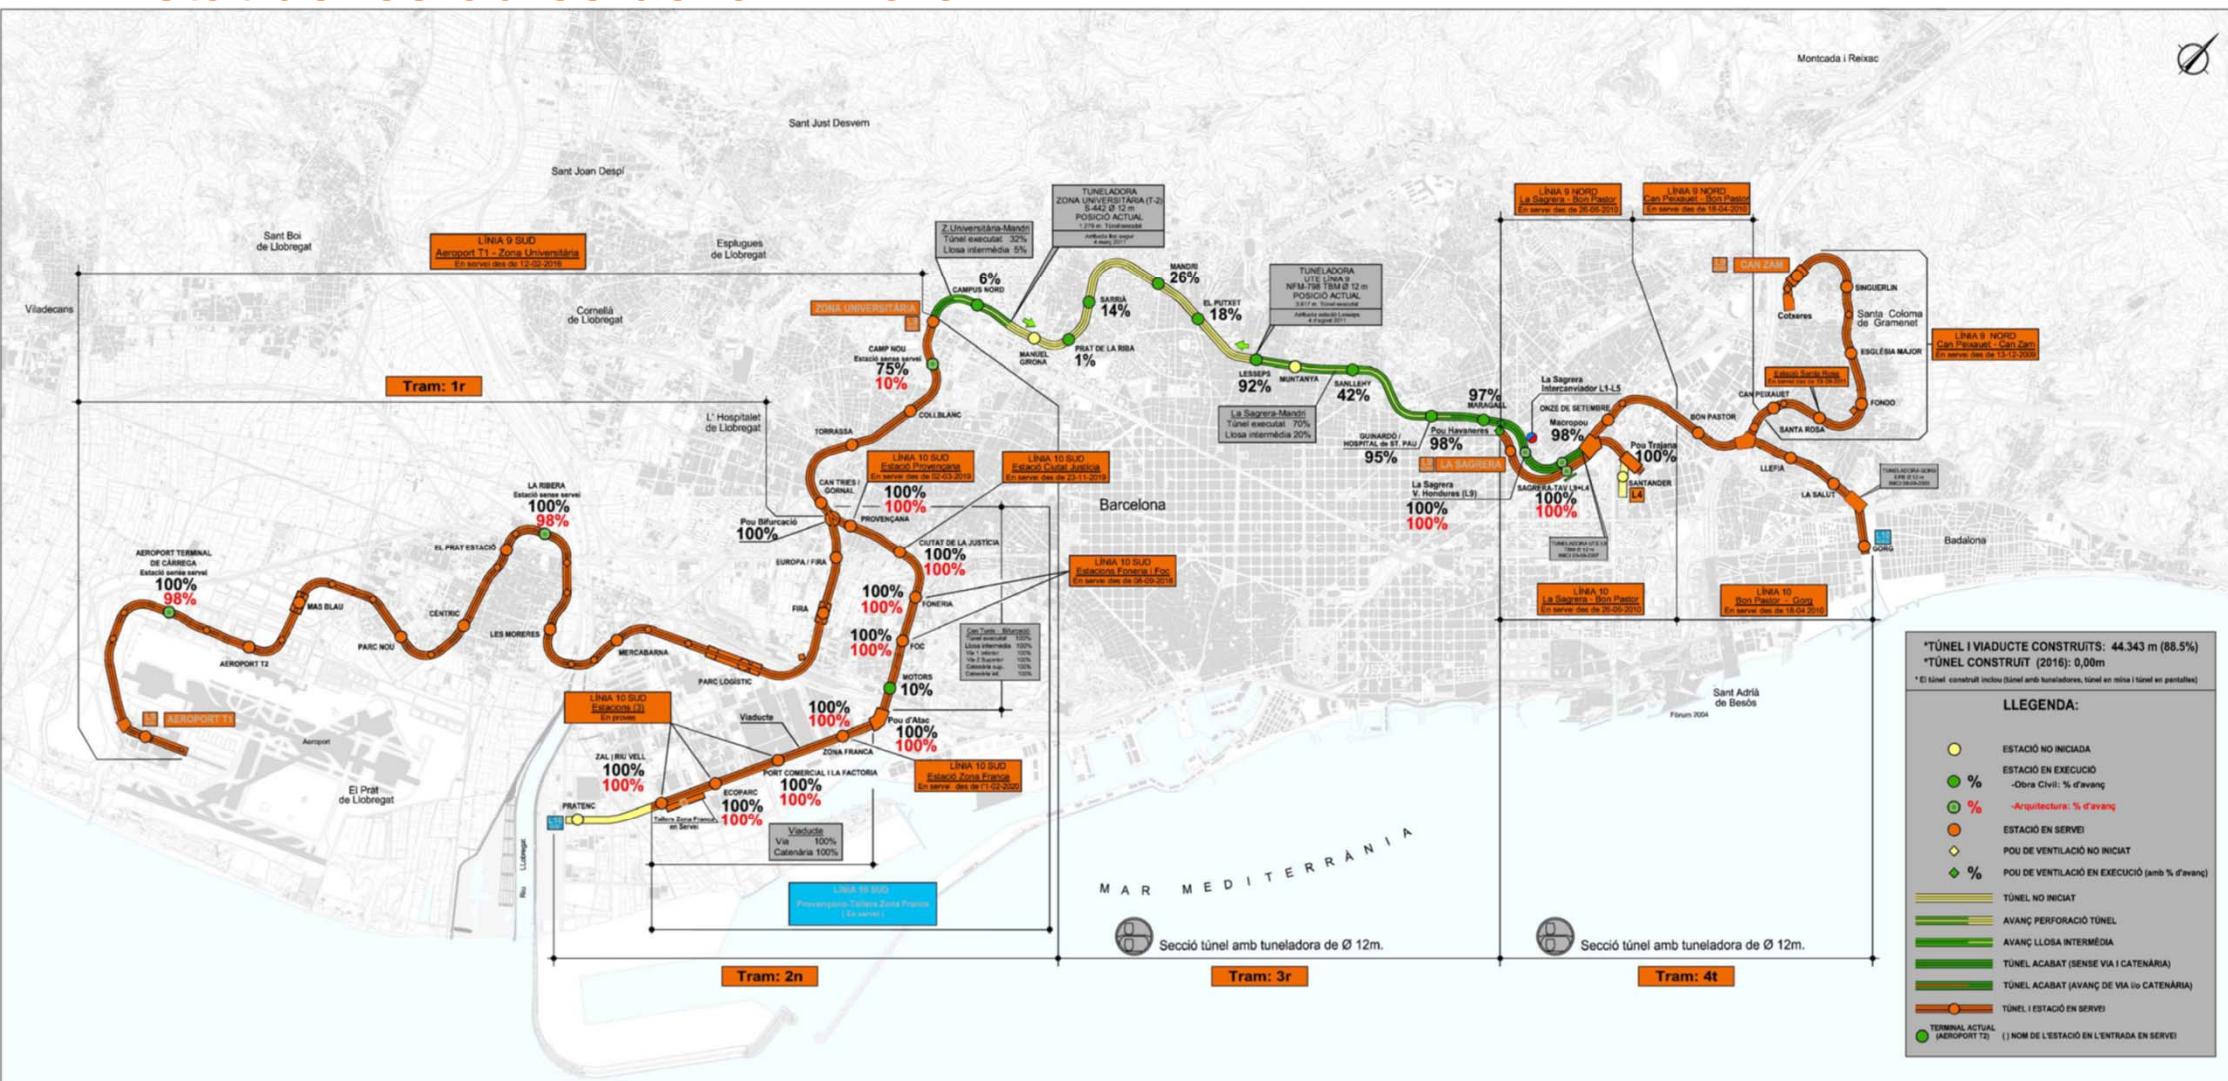

Actuacions en execució novembre 2021

Estació L9 Mandri – cobriment (TM-00509.4B-M5). Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

- Treballs principals període
 - Col·locació de la capa drenant i geotèxtil filtre a la zona enjardinament fase 1 de la finca de les monges
 - Execució del muret guia de les pantalles a executar del vestíbul
- Previsió planificació
 - Cobriment parcial pou estació: abril – desembre 2021
 - Execució fase 1 de les pantalles del vestíbul: octubre – desembre 2021
 - Restitució parcial ocupació finca privada monges Mandri: primer trimestre 2022
 - Inici fase 2: muntatge pòrtic grua – buidat pou principis del 2022



Capa drenant zona enjardinament
Fase 1 de la finca de les monges



Col·locació geotèxtil filtre a la zona
enjardinament Fase 1 finca de les monges



Execució del muret guia de les
pantalles del vestíbul

Actuacions en execució novembre 2021

Línia 9 del Metro de Barcelona - Tram 3r. Zona Universitària – Mandri. Clau: TM-00509.4F2-M1

- Treballs principals període
 - Es segueix treballant en la posta a punt de la tuneladora S442 i instal·lacions auxiliars associades
 - Execució de l'estructura metàl·lica del forjat provisional al pou estació Camp Nou
- Planificació
 - Des del juliol 2021 al març 2022 treballs de la posta a punt de la tuneladora S442
 - A l'abril 2022 inici de l'excavació del túnel pendent del Tram 3



Treballs de reparació de les pinces de la grua pòrtic



Canvi de les bombes de la torre de refrigeració



Estructura metàl·lica forjat provisional pou estació Camp Nou



