


Activitat mensual

Infraestructures
Ferroviàries
de Catalunya

Febrer 2021

Estat de les obres de la Línia 9

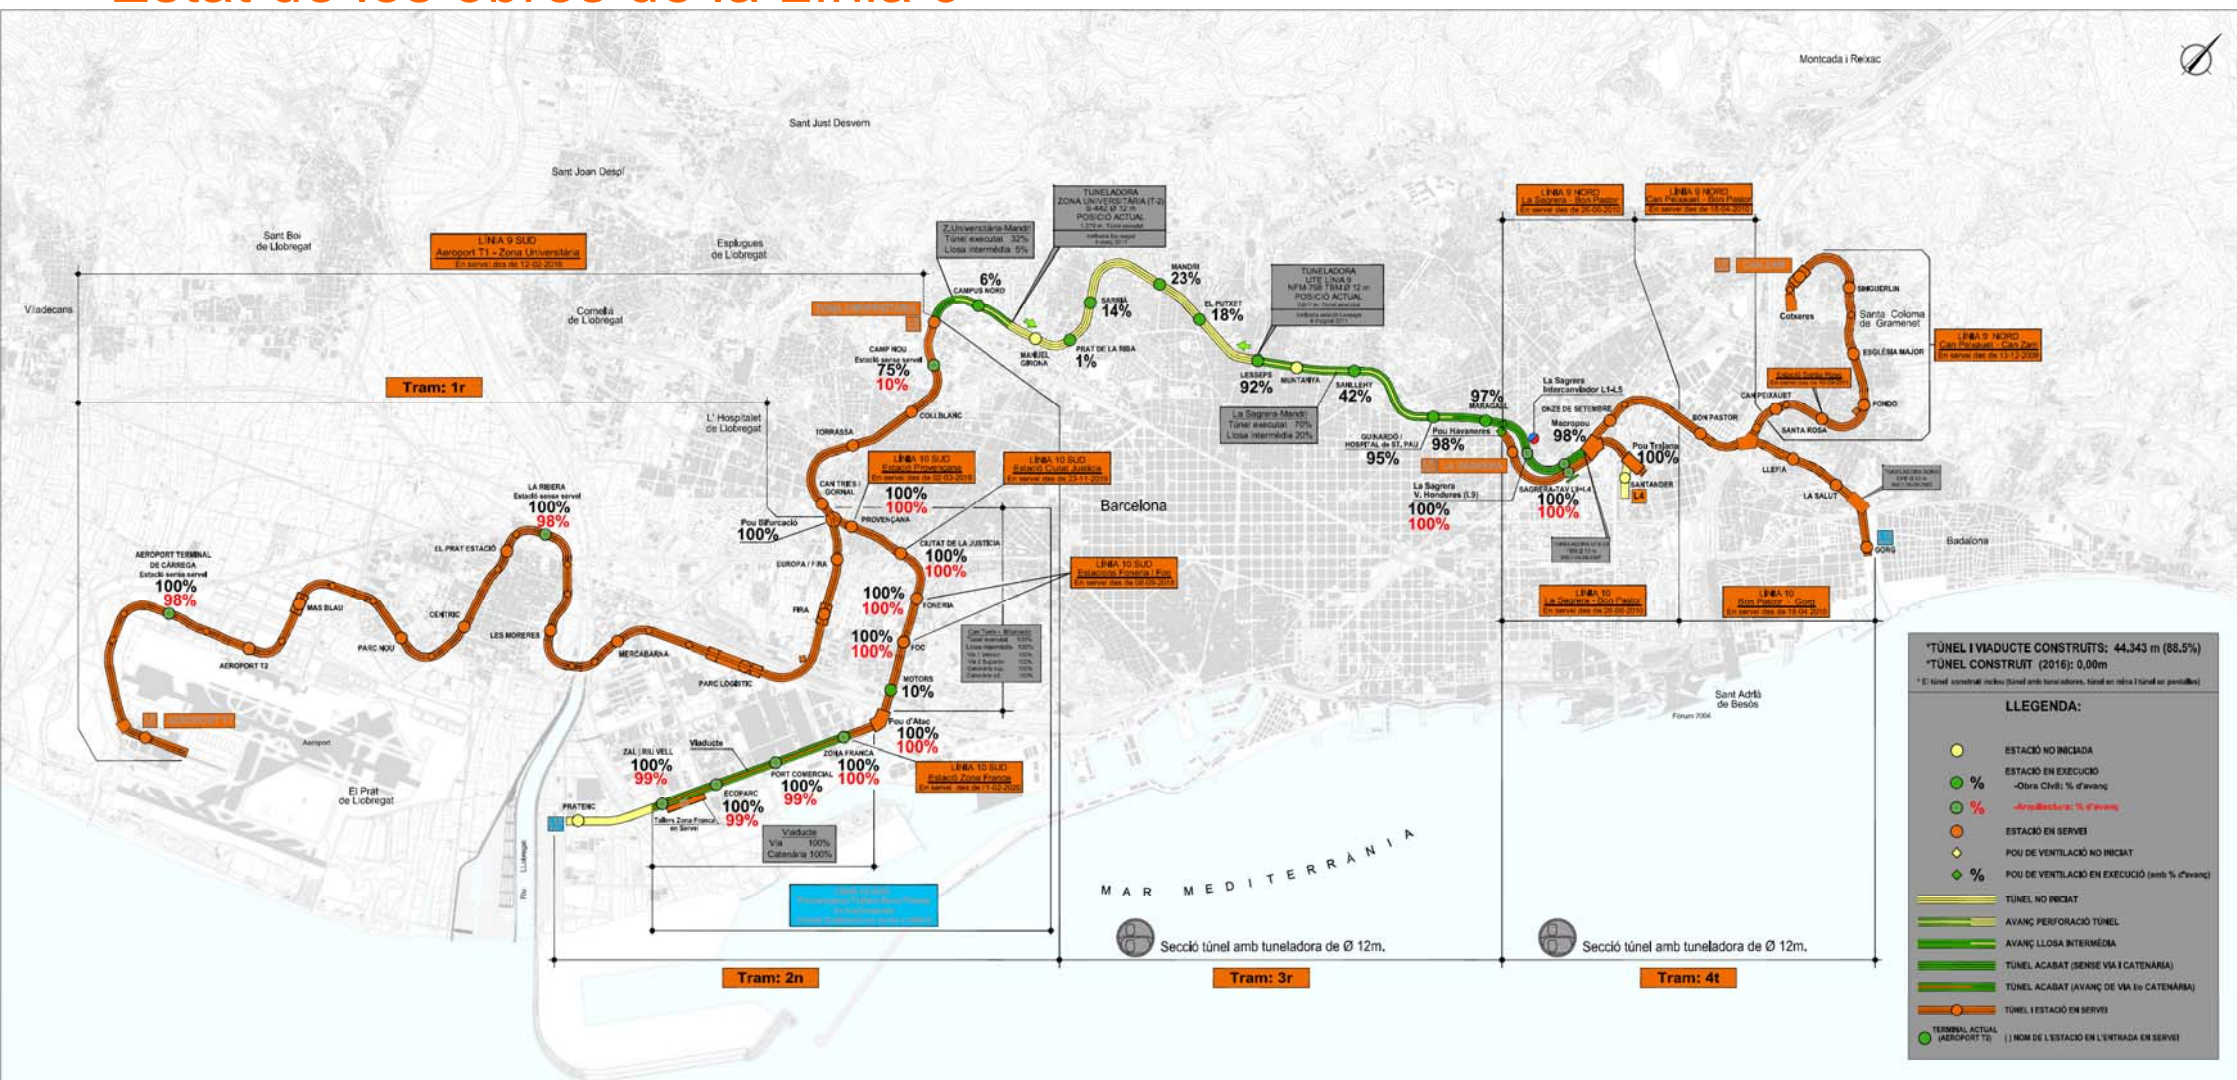

Actuacions en execució febrer 2021

Estació L9 Mandri – cubrició (TM-00509.4B-M5). Departament de Territori i Sostenibilitat

- 18.01.2021: reinici treballs estació L9 Mandri
 - 30/31.01: desviament de trànsit Passeig Bonanova + Carrer Mandri
 - Previsió desmuntatge pont grua: febrer – març 21
 - Cubrició parcial pou estació: previsió març – desembre 21
 - Restitució parcial ocupació finca privada monges Mandri: primer trimestre 2022



Desviament Carrer Mandri



Desviament Passeig Bonanova



Treballs previs per reinici obra

Actuacions en execució febrer 2021

Canvi fixacions Zona C. St. Adrià 194 –Bon Pastor (RO-17266.1). Departament de Territori i Sostenibilitat

- Inici treballs a obra 18.01.2021
 1. Acta de replanteig: 8 de setembre de 2020
 2. Fabricació i subministrament fixacions per a la via superior i inferior: 4 mesos
 3. Inici treballs obra: 18 de gener 2021
 4. Han introduït el material a obra i han iniciat els treballs de canvi de les fixacions a la via superior per noves fixacions Vanguard Retrofit

Previsió de finalització: maig 2021+ lectures per veure reducció vibracions



Noves fixacions a obra



Distribució fixacions



Col·locació fixacions

Actuacions en execució febrer 2021


Estacions viaducte: Port Comercial / La Factoria– Ecoparc – ZAL/Riu Vell

- Evolució de tasques a les estacions: febrer 2021

Estació	Escala mecànica	Ascensor PMR	Sistema de tancament de portes d'andana	Sistema Validació i venda	Senyalització informativa	Remats finals d'arquitectura
Port Comercial / La Factoria	Instal·lada	Instal·lat	Instal·lat (pendent proves)	Instal·lat (pendent proves)	En procés	Finalitzats
Ecoparc	Instal·lada	Instal·lat	Instal·lat (pendent proves)	Instal·lat (pendent proves)	En procés	Finalitzats
ZAL/Riu Vell	Instal·lada	Instal·lat	Instal·lat (pendent proves)	Instal·lat (pendent proves)	En procés	Finalitzats



Port Comercial: Vista general Estació

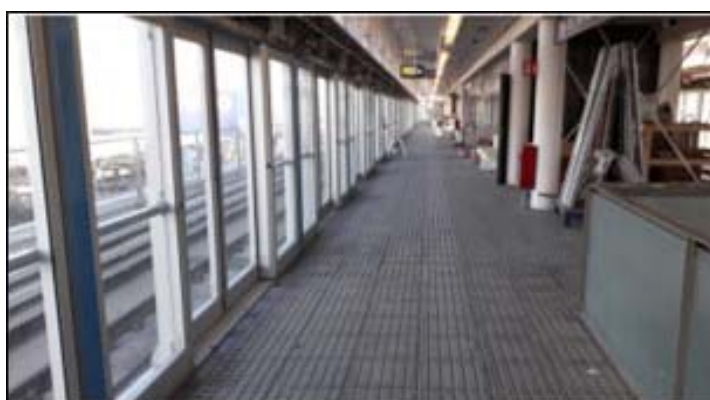

Zal / Riu Vell: Andana



Ecoparc: Andana

- Previsió de realització de les proves sistema: 15 a 18 de març 2021 / Previsió d'inici marxa en blanc: 1 d'abril 2021.

Actuacions en execució febrer 2021

Plaques fotovoltaïques (R2-19267). Departament de Territori i Sostenibilitat

- Evolució de tasques a les estacions: febrer 2021

Estació	Evolució de les feines
Zona Franca	En funcionament (Pendent integració del telecomandament)
Port Comercial/La Factoria	Plaques fotovoltaïques muntades, estesa de cablejat feta i quadres elèctrics i inversor en fase de muntatge
Ecoparc	Plaques fotovoltaïques muntades, estesa de cablejat feta i quadres elèctrics i inversor en fase de muntatge
ZAL/Riu Vell	Abassegament de material i perforació d'ancoratges en coberta



ZAL / RIU VELL: Abassegament de material i perforacions



Port Comercial/La Factoria: Plaques muntades



Ecoparc: Muntatge de quadres elèctrics

Actuacions en execució febrer 2021

Energia i Comunicacions L9 (TM-02609.6R). Departament de Territori i Sostenibilitat

- S'han posat en funcionament de Centres de Transformació de les següents ubicacions del Tram I de la Línia 9:
 - Aeroport Terminal de Càrrega (estació sense servei de viatgers)
 - La Ribera (estació sense servei de viatgers)
 - Pou PV1 (pou de ventilació)
 - Pou P5A (pou de ventilació)
- Aquestes posades en funcionament han permès donar de baixa les escomeses d'obra que encara estaven contractades, que suposaven una despesa anual aproximada de 110.000 €.
- A partir d'ara l'alimentació d'aquestes ubicacions es realitza des de la xarxa elèctrica de Línia 9, amb el conseqüent estalvi, doncs l'energia es compra a 220kV a un preu inferior i sense necessitat de pagar el terme fix de cada escomesa (terme de potència).



